


☺ (重信)総合研究棟 (医学系) 耐震改修 (Ⅳ期) 工事 ☺

■ 工事概要

建物名	医学部本館								
基本設計	愛媛大学施設基盤部	実施設計	【建築】(株)新企画設計		【設備】(株)新日本設備計画		工事監理	愛媛大学施設基盤部	
施工	【建築】 大和コンストラクション(株)		【電気】 越智電機産業(株)		【機械】 朝日管工(株)				
構造	SRC造	階	10階	建築面積	4,822 m ²	改修面積	4,630 m ²	工期	H24.5.1 ~ H25.3.29 (11ヶ月)
改修内容	【建築】耐震補強、屋上防水、内部改修、建具改修		【電気】電灯設備・情報通信設備・自動火災報知設備・非常放送設備改修			【機械】給排水設備・ガス設備・空調設備・消火設備改修			

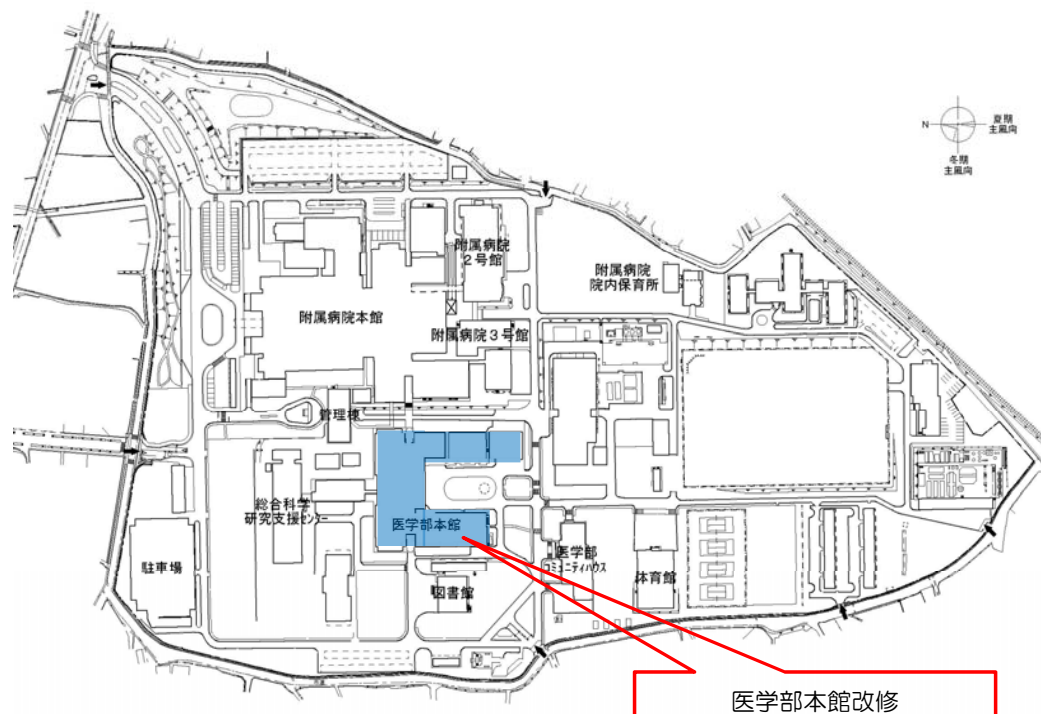

【工事状況(外構)】



【工事状況(外構)】



【改修前(実験スペース)】



【改修後(実験スペース)】
